

Etat d'avancement de remise en état au niveau des BAC IR03 et IR 10

Réalisé par : CHAFCHAOUNI MOUSSAOUI Mohamed

LE 24/11/2025

STOP SECURITE

LE 21/11/2025 , sensibilisation a été menée des risques liés au travaux en hauteur au niveau de l'entité 51 l'effectif présent : 7 personnes



BAC IR03

Travaux Réalisés

- Remplacement des tôles de fond du bac
- Remplacement des tôles marginales
- Reconstituions du lit de sable compacté
- Reconstitution de la couche de sable bitumineux
- Remplacement du bas de la 1ere virole
- Démontage du toit
- **Soudage de la 1^{ère} virole externe (achevé à 92 %)**
- **Préparation du toit du BAC**

Travaux en cours

- Soudage de la 1^{ère} virole INTERNE
- **Montage de l'échaffaudage de l'intérieur du bac pour montage de la 5^{ème} virole**


Etat d'avancement de la soudure au niveau de l'externe de la 1^{ère} virole

Haut de la 1 ^{ère} virole													
1000mm	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1500mm	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Bas de la 1 ^{ère} virole													

- La couleur **verte** met en évidence la progression de soudage des deux bouts des tôles de la première virole
- La partie **rouge** représente la 13^{ème} tôle d'accès
- L'état d'avancement au niveau la 1^{ère} virole est à : **92 %**




Etat d'avancement de la soudure au niveau de l'interne de la 1^{ère} virole

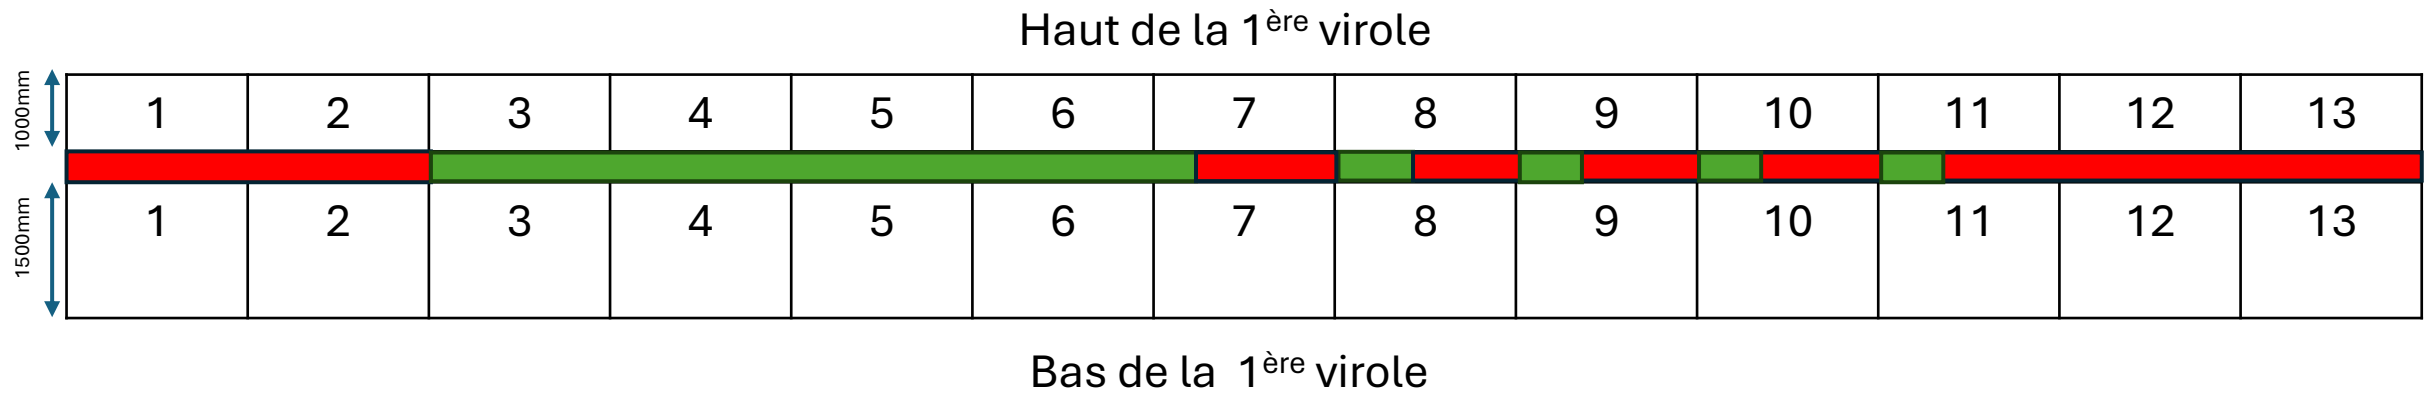

- L'état d'avancement de la soudure la 1ere virole interne est de **43 %**



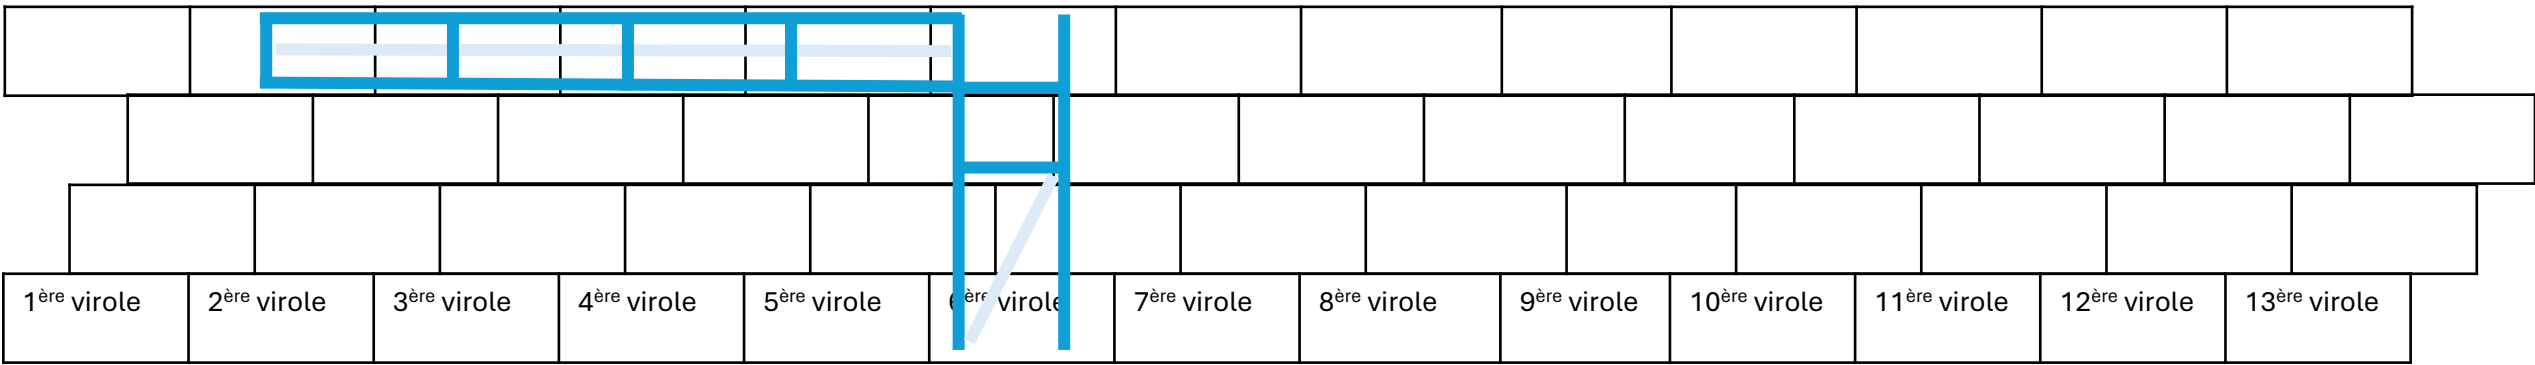

L'état d'avancement du montage d'échaffaudage est à **38%**

Le montage de l'échaffaudage a été suspendu pour raison suivante

➤ **CONSOLE NON ADEQUATE AU RAYON DU BAC**



BAC IR10

Travaux Réalisés

- Démontage des tôles de fond et marginale
 - Démontage des piquages de soutirage et de vidange
 - Supportage du toit
 - Démontage du toit
 - Démontage du support du toit
 -
- } **Achevé à 100 %**

Travaux en cours

- Evacuation de la ferraille

